




Travaux de mise en accessibilité des quais de la gare pour les personnes à mobilité réduite (PMR)

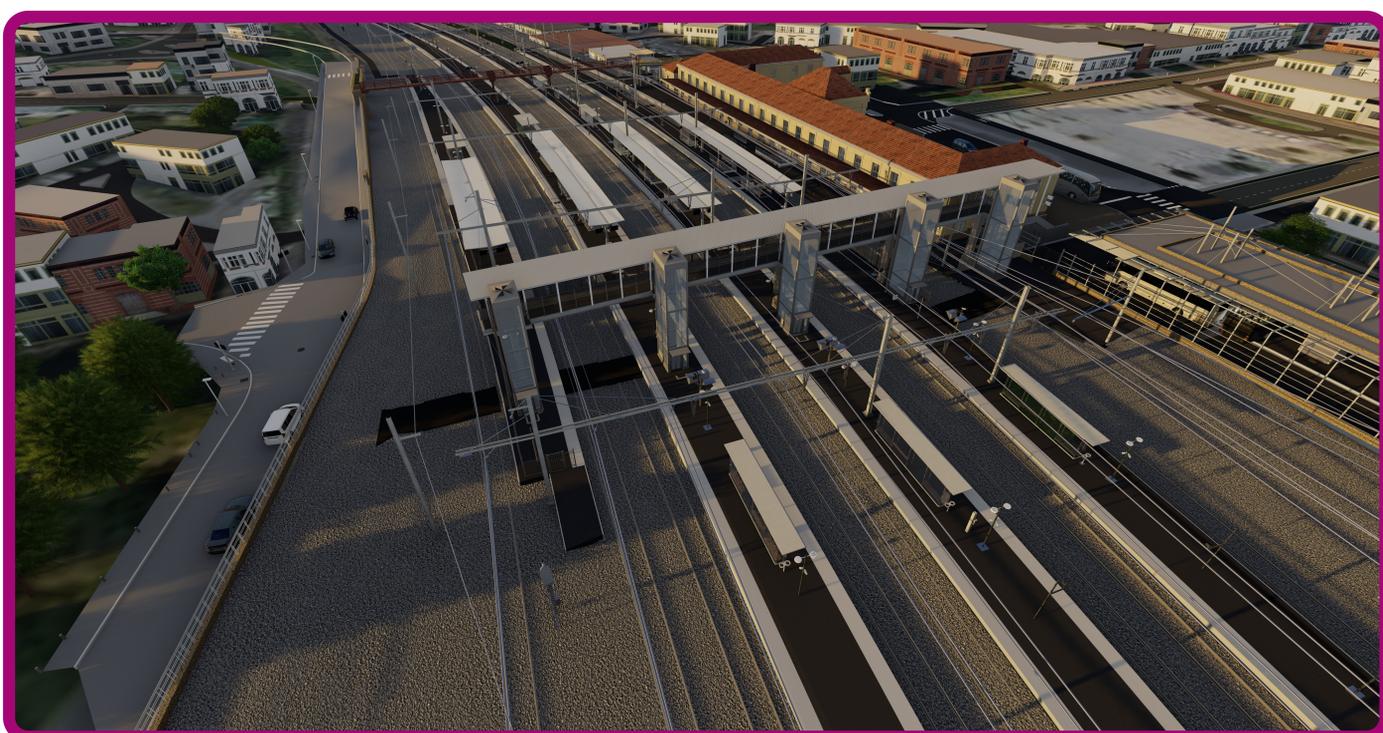

- **Mise en accessibilité** de la gare avec rehaussement des quais et mise aux normes pour les personnes à mobilité réduite
- **Allongement** du quai 1 puis réouverture aux voyageurs
- **Création d'une passerelle piétonne** équipée de cinq ascenseurs
- **Remplacement** de l'éclairage actuel par des LED
- **Renouvellement** des abris de quais
- **Reprise** de la signalétique voyageurs

Début des travaux

Août 2024

Fin des travaux

Septembre 2026

Coût du projet

33,466 M€

67%
par l'État,
soit 22,307M€



33%
par la Région
Bourgogne-Franche-Comté
soit 11,159M€



Planning prévisionnel des travaux


Phases 1 à 6

25 août 2024 au 25 avril 2025

- > Prolongement et rehaussement du quai 1 sur 110 mètres
- > Rehaussement du quai 2 sur 240 mètres
- > Rehaussement du quai 4 sur 400 mètres côté Voie 2bis
- > Travaux de fondations de la passerelle et des abris sur les quais 1 à 4
- > Dépose des abris de la gare et pose d'un nouvel abri sur le quai 2

Quai 2 : Fermeture alternée, côté **Voie A** puis **Voie C**

Quai 4 : Fermeture alternée, côté **Voie 2** puis **Voie 2bis**

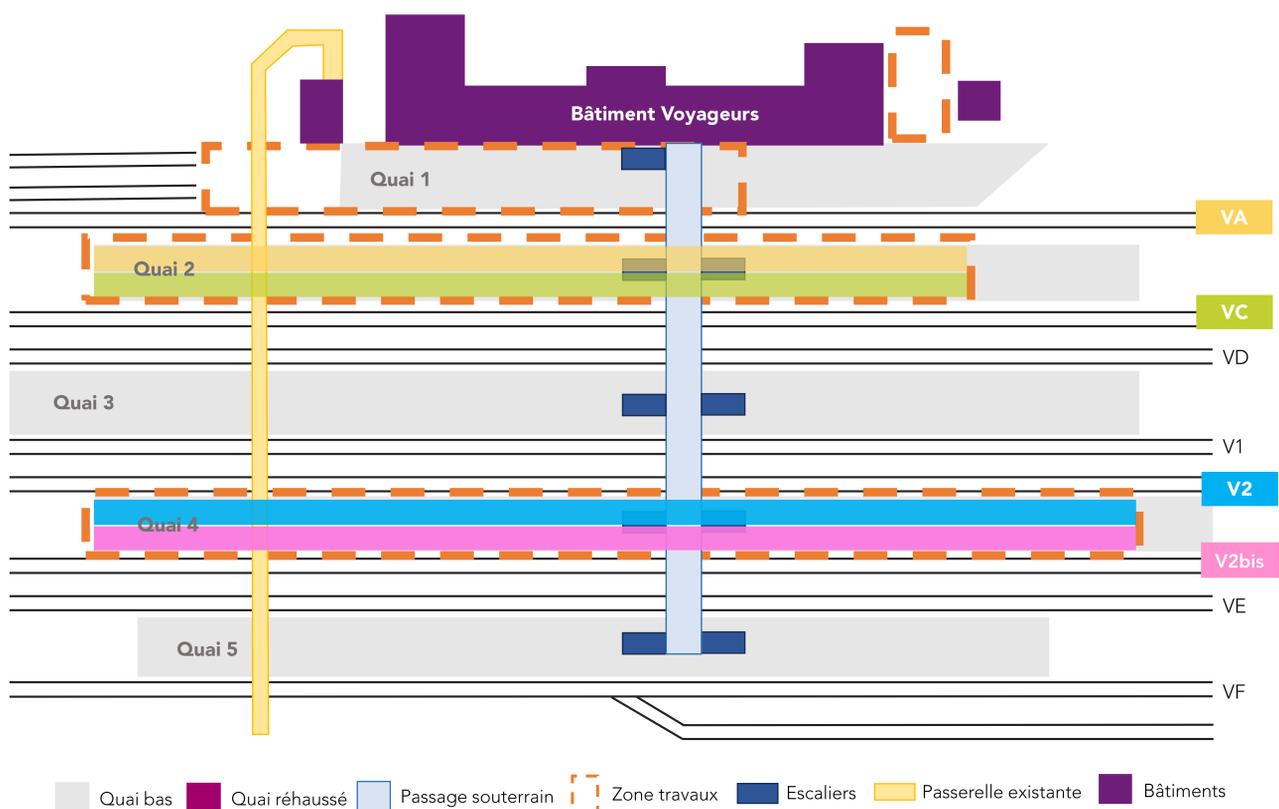


Phase 7

28 avril au 18 juillet 2025

- > Rehaussement du quai 4 côté Voie 2 sur 400 mètres et pose de l'abri
- > Rehaussement du quai 5
- > Travaux de fondations de la passerelle et des abris sur le quai 5

Quai 4 : Fermeture partielle, côté **Voie 2**

Quai 5 : Fermeture partielle, côté **Voie E**

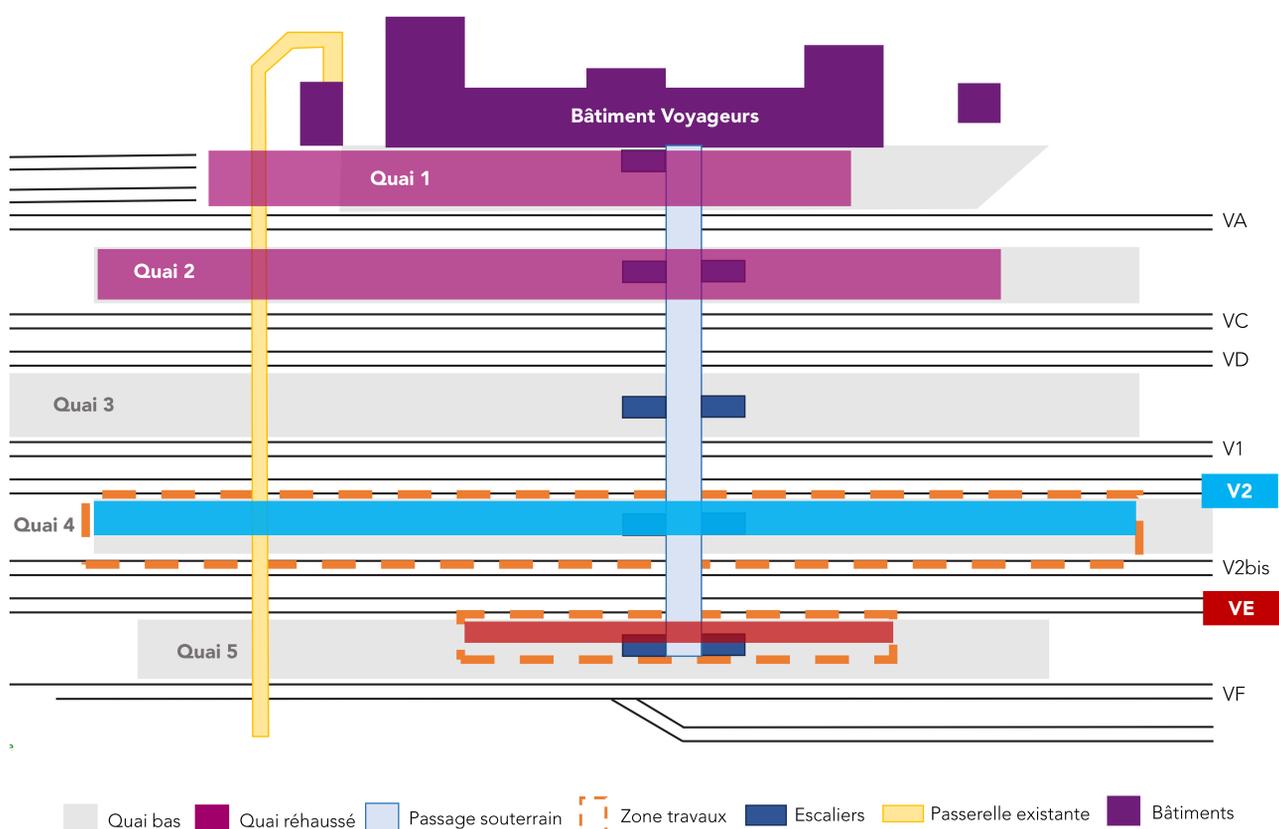




Planning prévisionnel des travaux

Phase 8

21 juillet au 3 octobre 2025

- > Fin du rehaussement du quai 4 côté Voie 2 sur 400 mètres
- > Fin du rehaussement du quai 5 sur 150 mètres

Quai 5 : Fermeture complète du quai

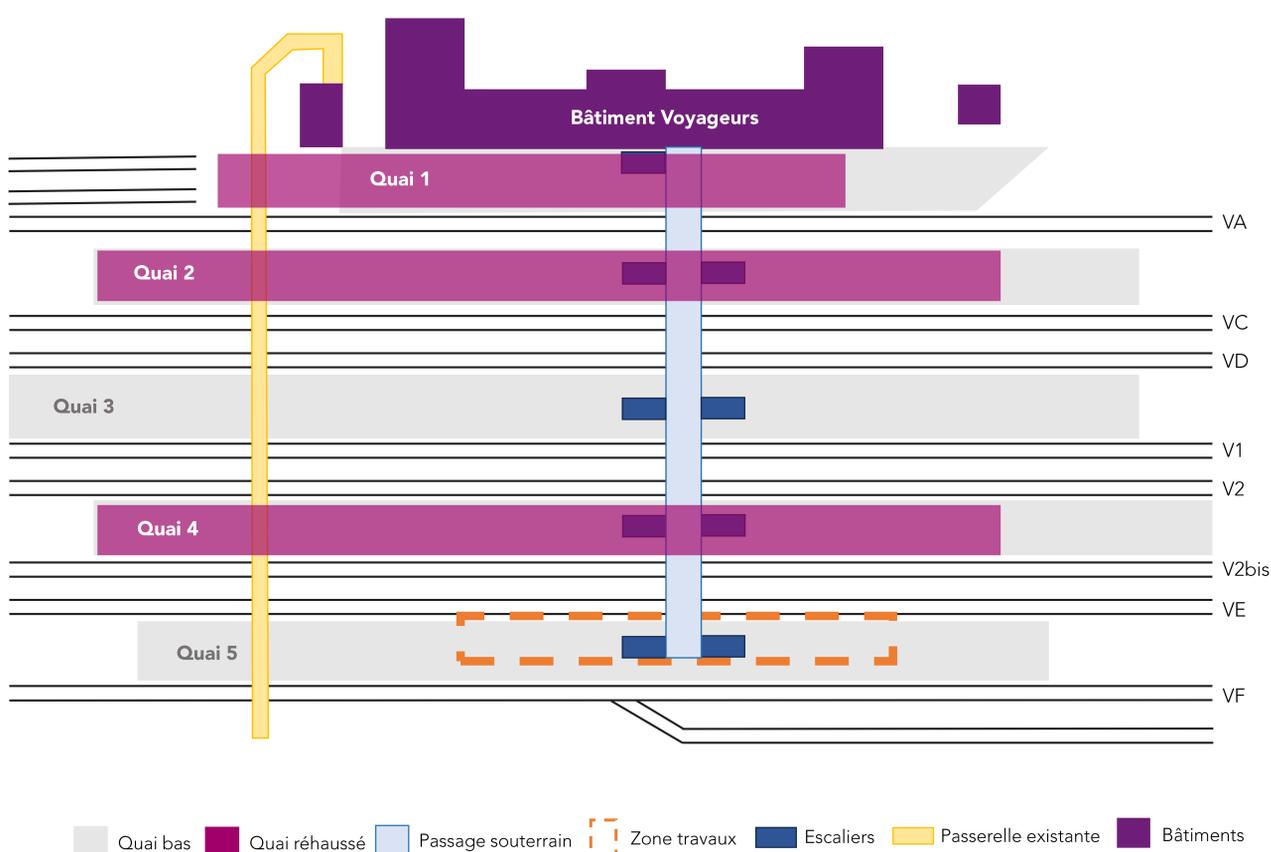


Phase 9, 10 et 11

6 octobre 2025 au 27 mars 2026

- > Rehaussement du quai 3 sur 400 mètres et travaux de fondations de la passerelle
- > Pose des abris des quais 3 et 5
- > Pose des éléments de la passerelle et des escaliers

Quai 3 : Fermeture alternée, côté **Voie D** puis **Voie 1**

Fermeture totale de la gare pendant un à deux week-end pour la pose des éléments de la passerelle

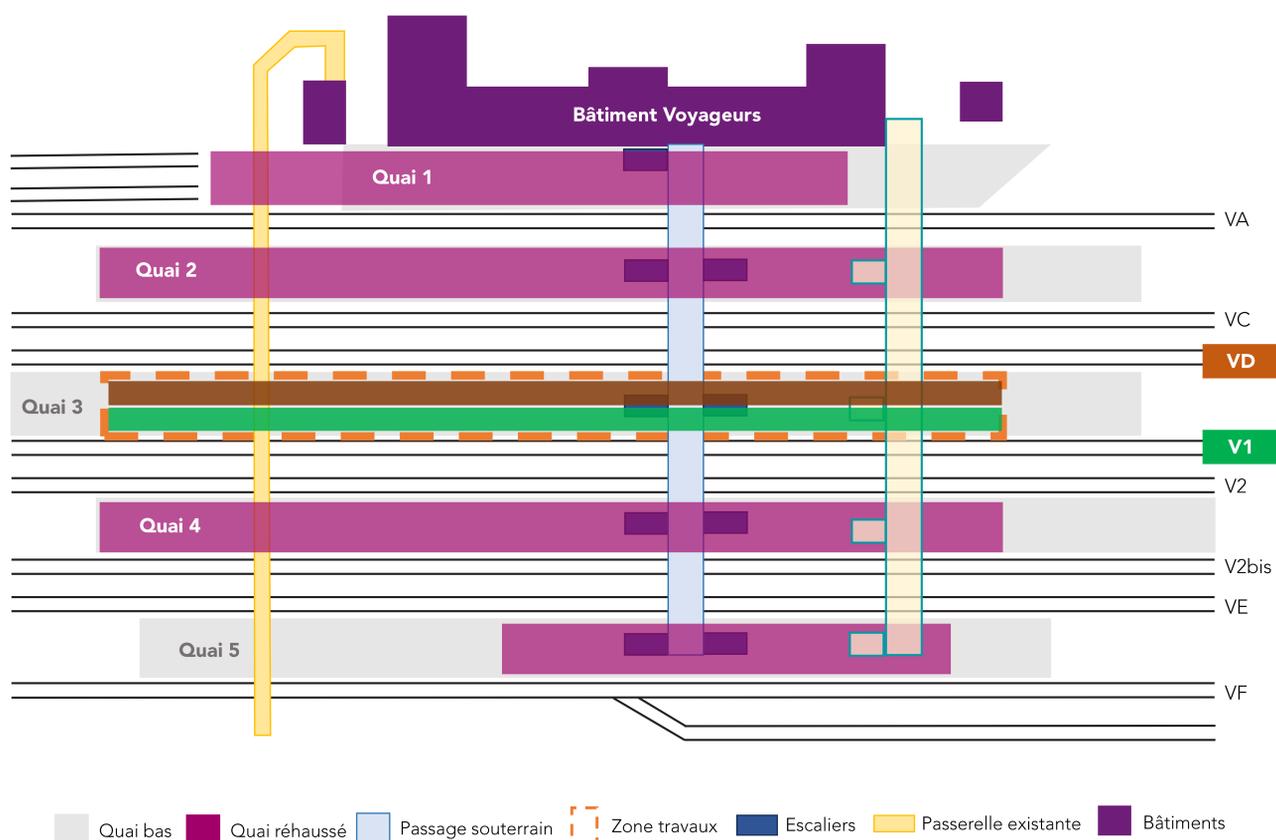



Planning prévisionnel des travaux

Phase 12 et 13

30 mars au 31 juillet 2026

- > Equipement des ascenseurs
- > Travaux de finitions sur l'ensemble de la gare

