

GARE PARIS LYON

ANALYSE SURVEILLANCE HEBDOMADAIRE - AC - N° 76

Date de diffusion	02/01/2023	DESTINATAIRES :	
Réf Rapport : ALEA CONTROLES	Rapports brut laboratoire	Date de prélèvement	26-12-2022
Réf Rapport : Lot 1 – L3A	Rapports brut laboratoire	Date de prélèvement	26-12-2022
Semaine de surveillance	Semaine 52-22	Rédacteurs : Hugues HARTMANN Sixela BOUTAMBA MBINA Aléa Contrôles	
Objet :	Analyse et commentaires consécutifs à la campagne de prélèvement de contrôle de l'ambiance plomb Zones publique N38 - Bases Vie – Zones chantier		


Nota : la limite de détection du laboratoire est < à 10µg/m²

Généralités :

- ⇒ Aucune alerte dans la base-vie.
- ⇒ Aucune alerte en zone publique.
- ⇒ Aucune alerte en zone chantier.

(Surveillance zone chantier phase II intégrée dans la surveillance à partir de la semaine 32 de l'année 2021)

→ Visualisation synthétique de l'évolution des moyennes depuis l'adaptation de la surveillance ←

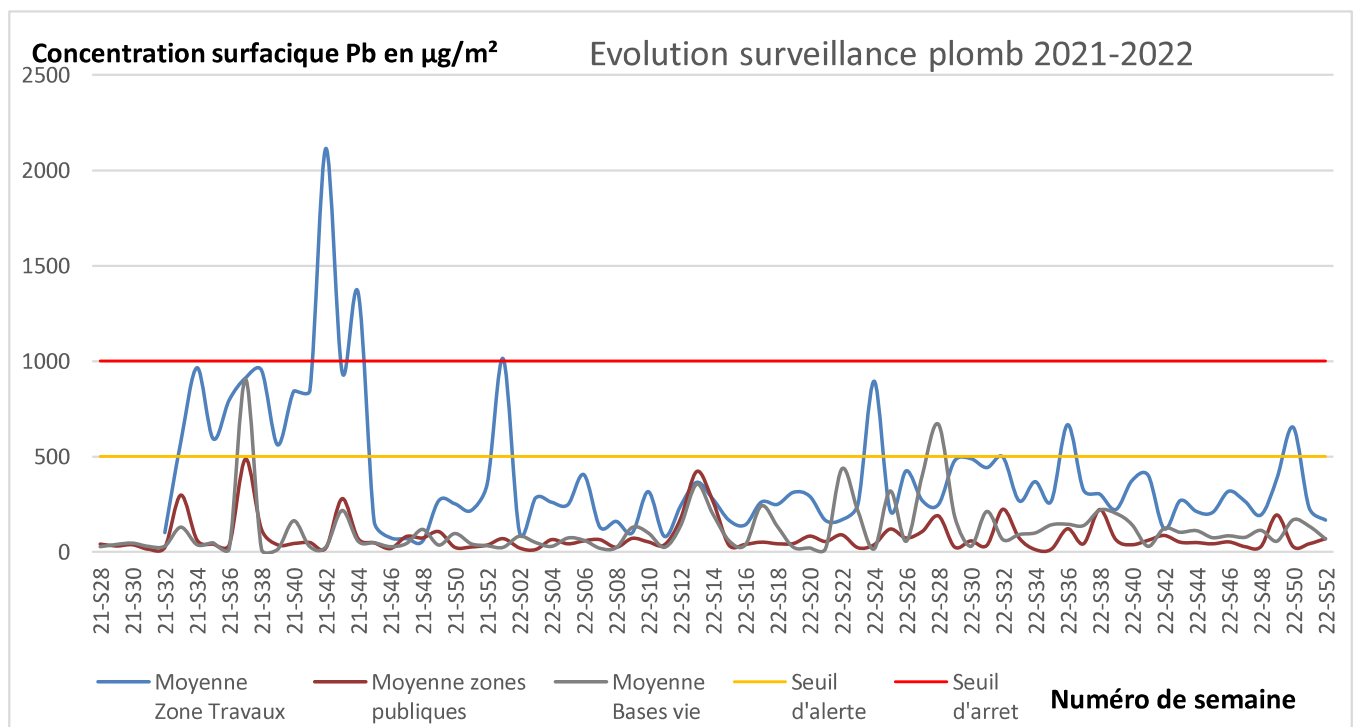

Relevé compilé – PHV – HALL 1 – Zone publique

N° prélèvement	Localisation	Support	Concentration μ/m^2	Remarque
HALL 1 - Zone sous PHV				
P 01	Sous PHV - coté Chalon - coté Nord	Carrelage	15,20	
P 02	Sous PHV - coté Chalon - coté Sud	Carrelage	11,20	
P 03	Sous PHV - centre	Carrelage	549,20	
P 04	Sous PHV - coté Bercy - coté Nord	Carrelage	12,00	
P 05	Sous PHV - coté Bercy - Centre	Carrelage	27,20	
P 06	Sous PHV - coté Bercy - coté Sud	Carrelage	76,40	
Moyenne :			115,20	
HALL 1 - Entrée				
P 07	Bercy	Carrelage	16,40	
P 08	Parvis - Sud	Carrelage	25,60	
P 09	Parvis - Nord	Carrelage	26,80	
P 10	Chalon - salle des fresques	Carrelage	11,20	
HALL 1 - Quai transversal				
P 11	Zone Nord	Carrelage	30,40	
P 12	Zone Sud	Carrelage	14,40	
Moyenne :			22,40	
Hall 1 - surveillance sur bache de protection PHV - Coté Nord				
Moyenne de l'ensemble des mesures au sol :			68,00	

Commentaires / analyses

- ⇒ **Le P03 est au-dessus du seuil d'alerte de 500 μ g/m² mais ne semble pas lié au chantier où la moyenne de mesures au sol est très faible cette semaine. Une**
- ⇒ **Les autres points de la zone publique ont eux-aussi ont des taux très faibles.**

Mesures correctives

- ⇒ **Le P03 sera nettoyé lors des opérations quotidiennes de nettoyage.**
- ⇒ **Une vigilance des taux de ce point sera effectuée dans les semaines à venir.**

Mesures préventives

- ⇒ Poursuivre les opérations préventives de nettoyage

PLY-PHV - N38 - Plan de localisation des analyses MOA

