

GARE PARIS LYON

ANALYSE SURVEILLANCE HEBDOMADAIRE - AC - N° 101

Date de diffusion	29/06/2023	DESTINATAIRES :	
		AREP – GARE ET CONNEXIONS - PARVIS	
Réf Rapport : ALEA CONTROLES	Rapports brut laboratoire	Date de prélèvement	19-06-2023
Réf Rapport : Lot 1 – L3A	Rapports brut laboratoire	Date de prélèvement	19-06-2023
Semaine de surveillance	Semaine 25-23	Rédacteurs : Hugues HARTMANN Sixela BOUTAMBA MBINA Aléa Contrôles	
Objet :	Analyse et commentaires consécutifs à la campagne de prélèvement de contrôle de l'ambiance plomb Zones publique N38 - Bases Vie – Zones chantier		


Nota : la limite de détection du laboratoire est $< 10\mu\text{g}/\text{m}^3$

Généralités :

- ⇒ Aucune alerte particulière dans la base-vie.
- ⇒ **Un point au-dessus de $500\mu\text{g}/\text{m}^3$ en zone publique.**
- ⇒ **Légère augmentation en zone chantier due à une inondation dans le chantier.**

(Surveillance zone chantier phase II intégrée dans la surveillance à partir de la semaine 32 de l'année 2021)

→ Visualisation synthétique de l'évolution des moyennes depuis l'adaptation de la surveillance ←

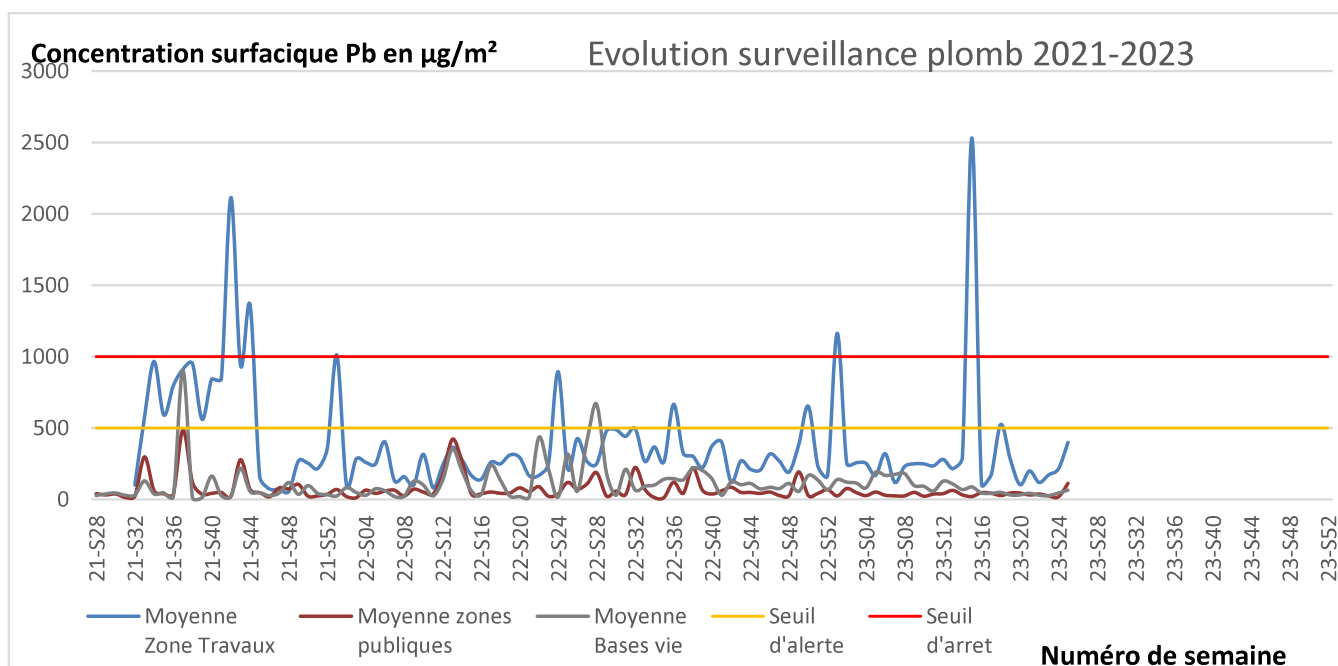

Relevé compilé – PHV – HALL 1 – Zone publique

N° prélè- ment	Localisation	Support	Concentration μ/m²	Remarque
HALL 1 - Zone sous PHV				
P 01	Sous PHV - coté Chalon - coté Nord	Carrelage	21,60	
P 02	Sous PHV - coté Chalon - coté Sud	Carrelage	36,00	
P 03	Sous PHV - centre	Carrelage	61,60	
P 05	Sous PHV - coté Bercy - Centre	Carrelage	52,40	
P 06	Sous PHV - coté Bercy - coté Sud	Carrelage	36,80	
Moyenne :			41,68	
HALL 1 - Entrée				
P 07	Bercy	Carrelage	23,20	
P 08	Parvis - Sud	Carrelage	29,20	
P 09	Parvis - Nord	Carrelage	51,60	
P 10	Chalon - salle des fresques	Carrelage	14,40	
HALL 1 - Quai transversal				
P 11	Zone Nord	Carrelage	85,60	
P 12	Zone Sud	Carrelage	832,80	
Moyenne :			459,20	
Hall 1 - surveillance sur bache de protection PHV - Coté Nord				
Moyenne de l'ensemble des mesures au sol :			113,20	

Commentaires / analyses

⇒ **Le P12 sonne au-dessus de 500μg/m².**

Mesures correctives

⇒ **Nettoyage de la zone autour du P12**

Mesures préventives

- ⇒ Poursuivre les opérations préventives de nettoyage
- ⇒ Maintenir pour l'ensemble des intervenants, le niveau actuel d'exigence du respect des procédures

