

GARE PARIS LYON

ANALYSE SURVEILLANCE HEBDOMADAIRE - AC - N° 119

Date de diffusion	27/10/2023	DESTINATAIRES :	
Réf Rapport : BJJ	Rapports brut laboratoire	Date de prélèvement	23-10-2023
Réf Rapport : Lot 1 – L3A	Rapports brut laboratoire	Date de prélèvement	23-10-2023
Semaine de surveillance	Semaine 43-23	Rédacteurs : Hugues HARTMANN Sixela BOUTAMBA MBINA Aléa Contrôles	
Objet :	Analyse et commentaires consécutifs à la campagne de prélèvement de contrôle de l'ambiance plomb Zones publique N38 - Bases Vie – Zones chantier		


Nota : la limite de détection du laboratoire est $< 10\mu\text{g}/\text{m}^2$ en zone chantier et $< 60\mu\text{g}/\text{m}^2$ en zone publique et dans la base vie

Généralités :

- ⇒ Aucune alerte dans la base-vie.
- ⇒ Aucune alerte en zone publique.
- ⇒ Aucune alerte en zone chantier.

(Surveillance zone chantier phase II intégrée dans la surveillance à partir de la semaine 32 de l'année 2021)

→ Visualisation synthétique de l'évolution des moyennes depuis l'adaptation de la surveillance ←

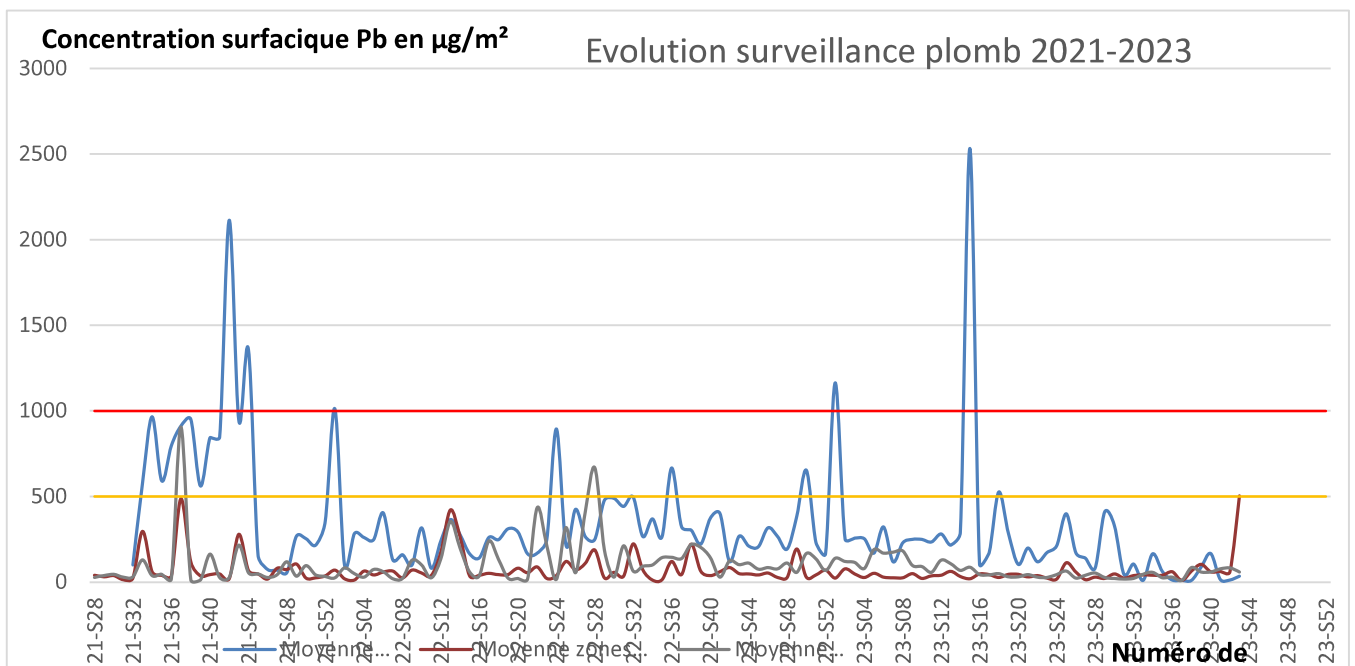

Relevé compilé – PHV – HALL 1 – Zone publique

N° prélèvement	Localisation	Support	Concentration μ/m^2	Remarque
HALL 1 - Zone sous PHV				
P 01	Entrée chantier	Carrelage	553,00	
P 02	A proximité de la palissade côté Big Fernand	Carrelage	654,00	
P 03	Palissage intermédiaire	Carrelage	1635,00	
P 04	Devant issue de secours	Carrelage	60,00	
P 05	Train Bleu	Carrelage	60,00	
P 06	Relay	Carrelage	60,00	
Moyenne de l'ensemble des mesures au sol :			503,67	

Commentaires / analyses

- ⇒ Les P01 et P02 sont supérieurs à 500 $\mu g/m^2$
- ⇒ Le P03 est supérieur à 1000 $\mu g/m^2$.
- ⇒ Les résultats ne nous permettent pas de conclure que cette augmentation des taux soit due à notre chantier mais nous allons faire intervenir 3DR pour un nettoyage.

Mesures correctives

- ⇒ Un nettoyage exceptionnel a été demandé à l'entreprise 3DR autour des points P01, P02 & P03 le 24/10 même s'il n'y a pas de lien établi entre la hausse de ces points et le chantier.
- ⇒ Le nettoyage a bien été effectué le 25/10.

Mesures préventives

- ⇒ Poursuivre les opérations préventives de nettoyage
- ⇒ Maintenir pour l'ensemble des intervenants, le niveau actuel d'exigence du respect des procédures

