

## GARE PARIS LYON

### ANALYSE SURVEILLANCE HEBDOMADAIRE - AC - N° 122

Date de diffusion	<b>24/11/2023</b>	<b>DESTINATAIRES :</b>	
Réf Rapport : BJL	<b>Rapports brut laboratoire</b>	Date de prélèvement	<b>13-11-2023</b>
Réf Rapport : Lot 1 – L3A	<b>Rapports brut laboratoire</b>	Date de prélèvement	<b>13-11-2023</b>
Semaine de surveillance	<b>Semaine 46-23</b>	Rédacteurs : Hugues HARTMANN Sixela BOUTAMBA MBINA Aléa Contrôles	
<b>Objet :</b>	<b>Analyse et commentaires consécutifs à la campagne de prélèvement de contrôle de l'ambiance plomb Zones publique N38 - Bases Vie – Zones chantier</b>		


**Nota : la limite de détection du laboratoire est  $< 10\mu\text{g}/\text{m}^2$  en zone chantier et  $< 60\mu\text{g}/\text{m}^2$  en zone publique et dans la base vie**

#### **Généralités :**

- ⇒ Aucune alerte dans la base-vie.
- ⇒ Aucune alerte en zone publique.
- ⇒ Aucune alerte en zone chantier.

(Surveillance zone chantier phase II intégrée dans la surveillance à partir de la semaine 32 de l'année 2021)

→ Visualisation synthétique de l'évolution des moyennes depuis l'adaptation de la surveillance ←

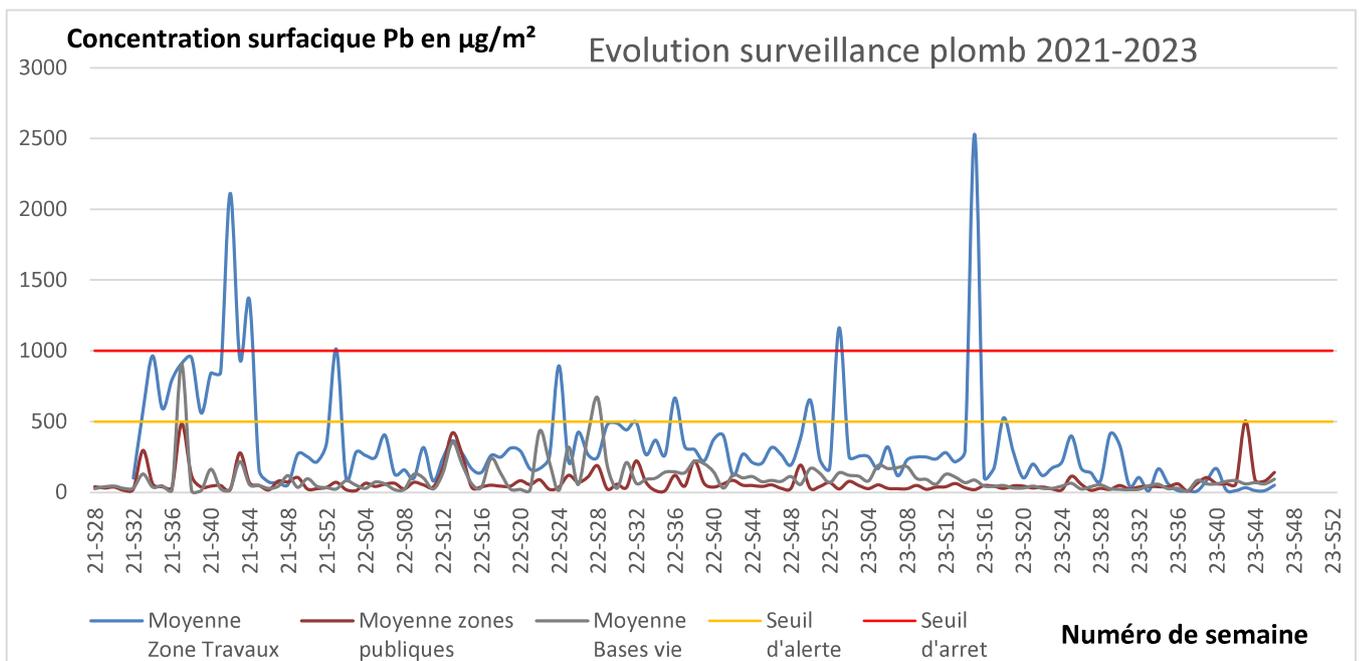

## Relevé compilé – PHV – HALL 1 – Zone publique

N° prélèvement	Localisation	Support	Concentration $\mu/m^2$	Remarque
<b>HALL 1 - Zone sous PHV</b>				
P 01	Entrée chantier	Carrelage	424,00	
P 02	A proximité de la palissade côté Big Fernand	Carrelage	89,00	
P 03	Palissage intermédiaire	Carrelage	81,00	
P 04	Devant issue de secours	Carrelage	84,00	
P 05	Train Bleu	Carrelage	89,00	
P 06	Relay	Carrelage	82,00	
<b>Moyenne de l'ensemble des mesures au sol :</b>			<b>141,50</b>	

### Commentaires / analyses

⇒ RAS

### Mesures correctives

⇒ RAS

### Mesures préventives

- ⇒ Poursuivre les opérations préventives de nettoyage
- ⇒ Maintenir pour l'ensemble des intervenants, le niveau actuel d'exigence du respect des procédures

