

Mai 2023

GARE DE PARIS SAINT LAZARE

Prélèvements lingette

Quais et Equipements sur les quais

Rénovation de la Grande Halle Voyageurs de Paris Saint-Lazare

Les travaux de changement des filets de protection de la grande halle voyageurs de la gare de Paris Saint-Lazare nécessitent **d'intervenir sur des structures métalliques en toiture recouvertes de peintures pouvant contenir du plomb.**

Ce chantier se déroule **de nuit**, en **l'absence de public**. Les entreprises intervenant respectent un protocole spécifique pour entrer et sortir des zones traitées et éviter toute exportation de traces de plomb vers les zones accessibles au public. Par ailleurs, dans le cadre de ce chantier et pour la sécurité de tous, les espaces à l'intérieur de la gare font régulièrement l'objet **d'opérations de nettoyage et de surveillance régulières** réalisées par un laboratoire agréé. Il est cependant recommandé de respecter les gestes habituels d'hygiène, en particulier le lavage régulier des mains.

SNCF Gares & Connexions publie les prélèvements de contrôle des teneurs en plomb mesurées dans l'espace public de la gare.




Ces mesures sont disponibles sur le site :
<https://www.garesetconnexions.sncf/fr/actualites/rapports-resultats-mesures-concentration-plomb-gare-paris-saint-lazare>

Quai 1

Revêtement des quais – quai avec travaux de remplacement des filets

Avant et Pendant travaux				Après travaux, nettoyage ou décontamination			
N° test	Date du prélèvement	Prélèvement	Support du prélèvement	Résultat lingette avt Tvx (en $\mu\text{g}/\text{m}^2$)	N° du prélèvement	Date du prélèvement	Résultat lingette ap nettoyage (en $\mu\text{g}/\text{m}^2$)
22290-15	15/12/2022	Quai 1 Halle 1 - voie 1 filet 13	Sol	90,0	22264-124	18/04/2023	464,0

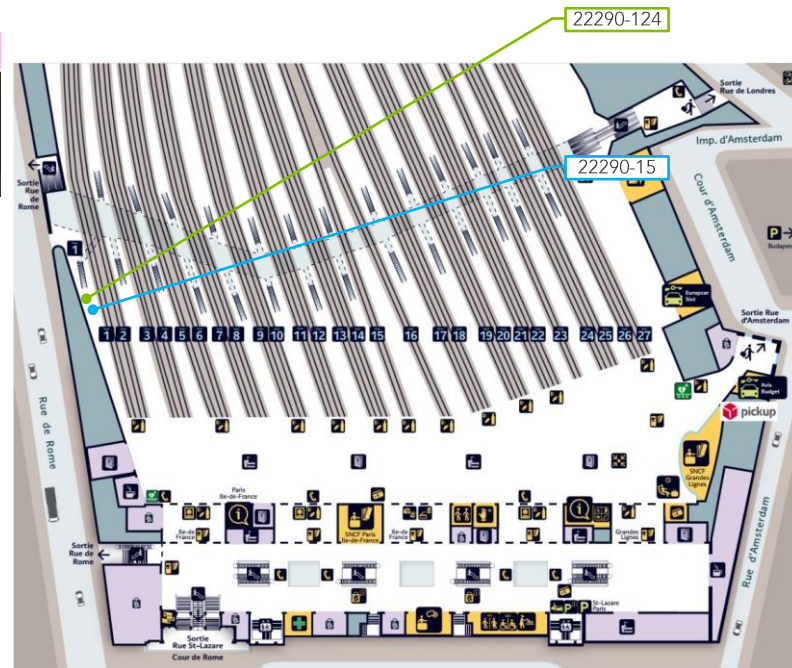


* Seuil du code de la santé publique applicable aux immeubles d'habitation fréquentés régulièrement par les mineurs ou les femmes enceintes

Quai 4/5

Revêtement des quais – quai avec travaux de remplacement des filets

Avant et Pendant travaux				Après travaux, nettoyage ou décontamination			
N° test	Date du prélèvement	Prélèvement	Support du prélèvement	Résultat lingette avt Tvx (en µg/m ²)	N° du prélèvement	Date du prélèvement	Résultat lingette ap nettoyage (en µg/m ²)
22264-18	21/12/2022	Quai 4-5 - filet 6	Sol	58,0	22264-126	19/04/2023	58,0
22264-18	21/12/2022	Quai 4-5 - filet 7	Sol	58,0	22264-127	19/04/2023	37,6
22264-18	21/12/2022	Quai 4-5 - filet 1	Sol	58,0	22264-128	20/04/2023	164,0
22264-18	21/12/2022	Quai 4-5 - filet 9	Sol	58,0	22264-129	21/04/2023	54,8
22264-18	21/12/2022	Quai 4-5 - filet 10	Sol	58,0	22264-131	26/04/2023	216,8

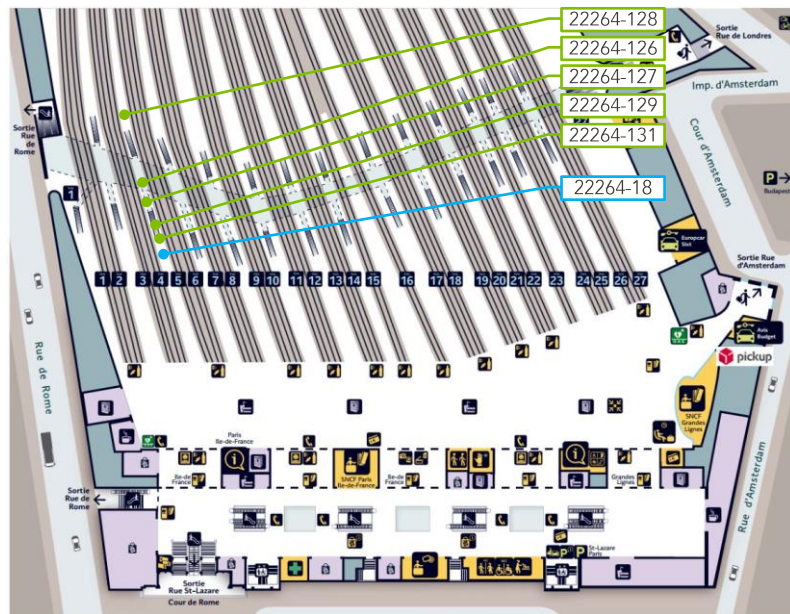

* Seuil du code de la santé publique applicable aux immeubles d'habitation fréquentés régulièrement par les mineurs ou les femmes enceintes

Quai 8/9


Revêtement des quais – quai avec travaux de remplacement des filets

Avant et Pendant travaux					Après travaux, nettoyage ou décontamination								
N° test	Date du prélèvement	Prélèvement	Support du prélèvement	Résultat lingette avt Tvx (en µg/m²)	N° du prélèvement	Date du prélèvement	Résultat lingette ap nettoyage (en µg/m²)	N° du prélèvement	Date du prélèvement	Résultat lingette ap nettoyage (en µg/m²)	N° du prélèvement	Date du prélèvement	Résultat lingette ap nettoyage (en µg/m²)
22264-41	05/12/2022	Quai 8-9 - filet 13	Sol	653,2	22264-130	21/04/2023	267,6						
22264-42	20/12/2022	Hall 2N voie 9 sol sous filet 2	Sol	297,2	22264-139	10/05/2023	3419,0	22 264-160	07/06/2023	1108,0	26 264-164	09/06/2023	918,4
22264-42	20/12/2022	Hall 2N voie 9 sol sous filet 2	Sol	297,2									
22264-42	20/12/2022	Hall 2N voie 9 sol sous filet 2	Sol	297,2									
22264-42	20/12/2022	Hall 2N voie 9 sol sous filet 4	Sol	297,2	22264-142	17/05/2023	255,6						
22264-42	20/12/2022	Hall 2N voie 9 sol sous filet 5	Sol	297,2	22264-143	17/05/2023	236,8						
22264-20	05/12/2022	Hall 2N voie 9 sol sous filet 8	Sol	1534	22264-148	23/05/2023	3262	23 264-161	07/06/2023	1431,0	27 264-165	09/06/2023	1144,0
22264-20	05/12/2022	Hall 2N voie 9 sol sous filet 8	Sol	1534									
22264-20	05/12/2022	Hall 2N voie 9 sol sous filet 8	Sol	1534									
22264-20	05/12/2022	Halle 2N - OUEST -Filet 9 - Voie 9	Sol	1534	22264-149	24/05/2023	1960	24 264-162	07/06/2023	1530,0	28 264-166	09/06/2023	1586,0
22264-20	05/12/2022	Halle 2N - OUEST -Filet 9 - Voie 9	Sol	1534									
22264-20	05/12/2022	Halle 2N - OUEST -Filet 9 - Voie 9	Sol	1534									
22264-20	05/12/2022	Hall 2N voie 9 sol sous filet 10	Sol	1534	22264-147	22/05/2023	1226	22264-158	06/06/2023	862,8			
22264-20	05/12/2022	Hall 2N voie 9 sol sous filet 10	Sol	1534									
22264-20	05/12/2022	Hall 2N voie 9 sol sous filet 11	Sol	1534	22264-145	19/05/2023	1400	22264-159	06/06/2023	638			
22264-20	05/12/2022	Hall 2N voie 9 sol sous filet 11	Sol	1534									
22264-20	05/12/2022	Hall 2N voie 9 sol sous filet 12	Sol	1534	22264-150	24/05/2023	2117	22264-146	19/05/2023	1632	25 264-163	07/06/2023	878,0
22264-20	05/12/2022	Hall 2N voie 9 sol sous filet 12	Sol	1534									
22264-20	05/12/2022	Hall 2N voie 9 sol sous filet 12	Sol	1534									

* Seuil du code de la santé publique applicable aux immeubles d'habitation fréquentés régulièrement par les mineurs ou les femmes enceintes

Quai 8/9

Revêtement des quais – quai avec travaux de remplacement des filets

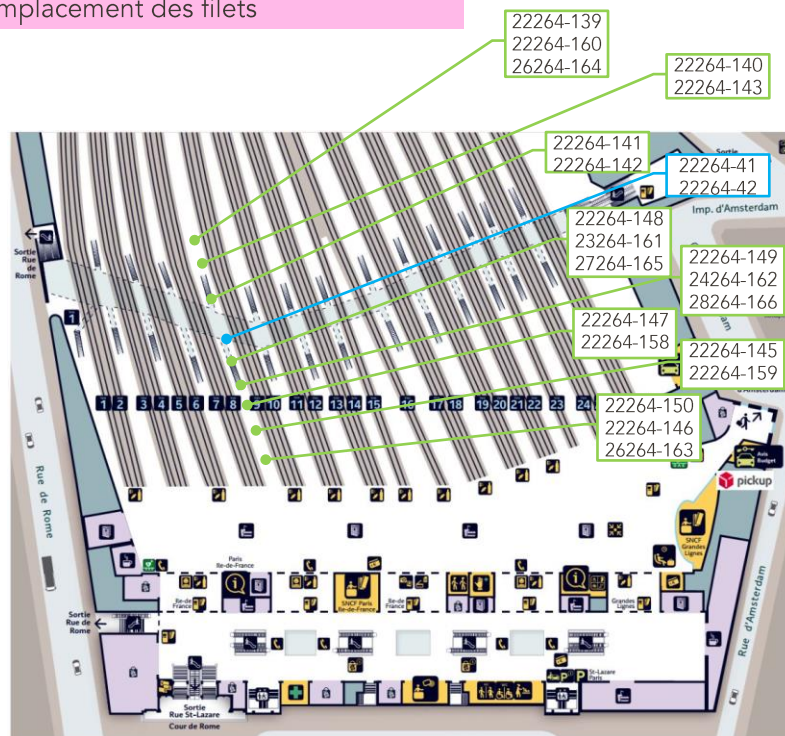


* Seuil du code de la santé publique applicable aux immeubles d'habitation fréquentés régulièrement par les mineurs ou les femmes enceintes

Quai 10/11

Revêtement des quais – quai avec travaux de remplacement des filets

Avant et Pendant travaux				Après travaux, nettoyage ou décontamination			
N° test	Date du prélèvement	Prélèvement	Support du prélèvement	Résultat lingette avt Tvx (en µg/m²)	N° du prélèvement	Date du prélèvement	Résultat lingette ap nettoyage (en µg/m²)
22290-09	09/12/2022	Quai 10/11 Halle 2N - filet 1	Sol	46,8	22264-119	04/04/2023	388,4
22290-09	09/12/2022	Quai 10/11 Halle 2N - filet 4	Sol	46,8	22264-120	06/04/2023	462,0

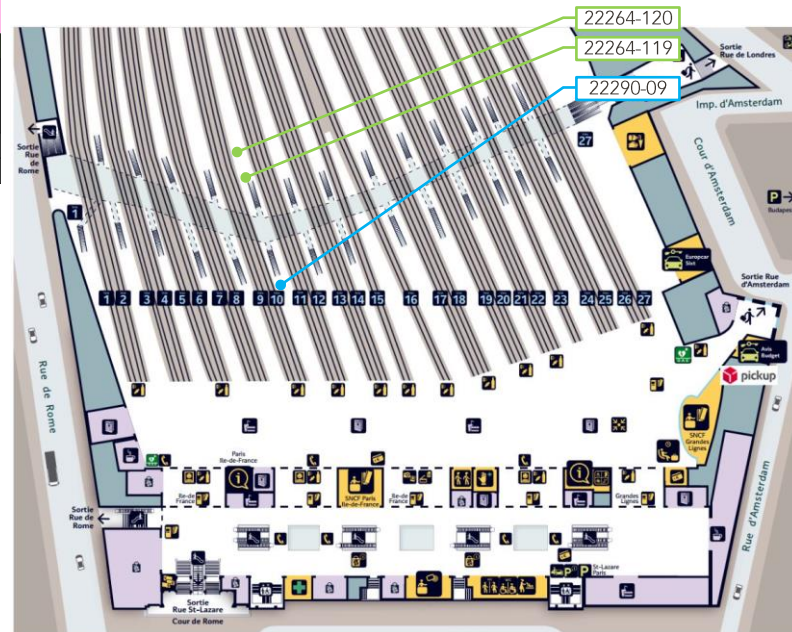


* Seuil du code de la santé publique applicable aux immeubles d'habitation fréquentés régulièrement par les mineurs ou les femmes enceintes

Quai 14/15

Revêtement des quais – quai avec travaux de remplacement des filets

Avant et Pendant travaux				Après travaux, nettoyage ou décontamination			
N° test	Date du prélèvement	Prélèvement	Support du prélèvement	Résultat lingette avt Tvx (en µg/m²)	N° du prélèvement	Date du prélèvement	Résultat lingette ap nettoyage (en µg/m²)
22290-21	05/12/2022	Quai 14/15 filet 5	Sol	826,0	22264-113	28/03/2023	595,2
22290-21	05/12/2022	Quai 14/15 filet 6	Sol	826,0	22264-114	29/03/2023	515,6
22290-21	05/12/2022	Quai 14/15 Hall 2N EST filet 7	Sol	826,0	22264-115	30/03/2023	596,4
22290-21	05/12/2022	Quai 14/15 Hall 2N EST filet 8	Sol	826,0	22264-116	30/03/2023	916,0
22290-21	05/12/2022	Quai 14/15 - filet 6	Sol	826,0	22264-123	13/04/2023	547,6
22290-21	05/12/2022	Quai 14/15 filet 5	Sol	826,0	22264-125	18/04/2023	768,4

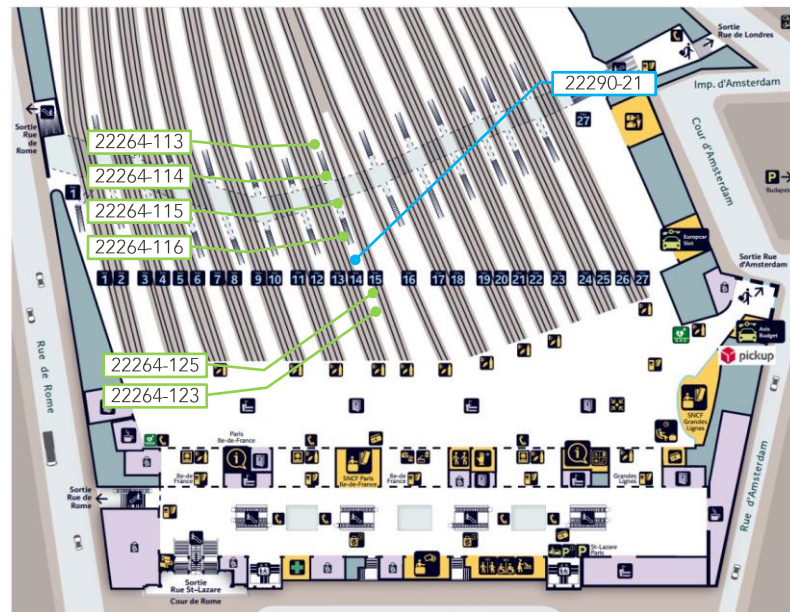


* Seuil du code de la santé publique applicable aux immeubles d'habitation fréquentés régulièrement par les mineurs ou les femmes enceintes

Quai 20/21

Revêtement des quais – quai avec travaux de remplacement des filets

Avant et Pendant travaux				Après travaux, nettoyage ou décontamination			
N° test	Date du prélèvement	Prélèvement	Support du prélèvement	Résultat lingette avt Tvx (en µg/m²)	N° du prélèvement	Date du prélèvement	Résultat lingette ap nettoyage (en µg/m²)
22264-26	28/12/2022	Hall 4N quai 20 sol sous filet 6	Sol	449,2	22264-132	28/04/2023	210,4
22264-26	28/12/2022	Hall 4N voie 20 sol sous filet 7	Sol	449,2	22264-144	19/05/2023	71,2

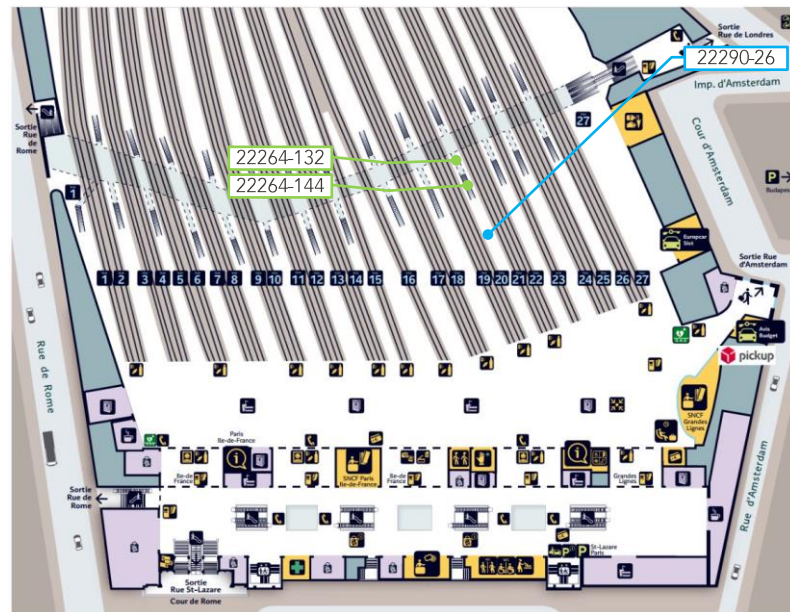


* Seuil du code de la santé publique applicable aux immeubles d'habitation fréquentés régulièrement par les mineurs ou les femmes enceintes

Voies 1 à 14

Revêtement des quais

Mesures initiales				Après nettoyage, si nécessaire			
N° test	Date du prélèvement	Prélèvement	Support du prélèvement	Résultat lingette (en µg/m²)	N° du prélèvement	Date du prélèvement	Résultat lingette ap nettoyage (en µg/m²)
23ENV004649-P1	16/05/2023	Quai transversal Face voies 6-7	Revêtement de quai Granit	75,2			
23ENV004649-P19	16/05/2023	Quai 2 Milieu de quai Voies 2/3	Revêtement de quai Bitume	236,0			
23ENV004649-P15	16/05/2023	Quai 4 Milieu de quai Voies 6/7	Revêtement de quai Bitume	644,4			
23ENV004649-P13	16/05/2023	Quai 7 Voies 12/13 Milieu de quai	Revêtement de quai Bitume	248,0			
572133-P1	25/04/2023	Voie 1 A l'air libre vers province	Revêtement de quai	94,4			
572133-P39	25/04/2023	Voie 1 côté rue de Rome	Revêtement de quai	200,4			
572133-P2	25/04/2023	Voie 2 A l'air libre vers province	Revêtement de quai	61,2			
572133-P3	25/04/2023	Voie 3 A l'air libre vers province	Revêtement de quai	110,8			
572133-P4	25/04/2023	Voie 4 A l'air libre vers province	Revêtement de quai	105,2			
572133-P38	25/04/2023	Voie 4 milieu halle 1	Revêtement de quai	154,8			
572133-P5	25/04/2023	Voie 5 A l'air libre vers province	Revêtement de quai	57,6			
572133-P6	25/04/2023	Voie 6 A l'air libre vers province	Revêtement de quai	35,2			
572133-P7	25/04/2023	Voie 7 A l'air libre vers province	Revêtement de quai	55,6			
572133-P8	25/04/2023	Voie 8 A l'air libre vers province	Revêtement de quai	150,8			
572133-P37	25/04/2023	Voie 8 Intersection halle 2N et 3N	Revêtement de quai	1 378,8	573571-P1	17/05/2023	745,2
572133-P9	25/04/2023	Voie 9 A l'air libre vers province	Revêtement de quai	541,6			
572133-P10	25/04/2023	Voie 10 A l'air libre vers province	Revêtement de quai	207,6			
572133-P11	25/04/2023	Voie 11 A l'air libre vers province	Revêtement de quai	329,6			
572133-P36	25/04/2023	Voie 11 Au milieu Halle 2N	Revêtement de quai	178,0			
572133-P12	25/04/2023	Voie 12 A l'air libre vers province	Revêtement de quai	248,0			
572133-P13	25/04/2023	Voie 13 A l'air libre vers province	Revêtement de quai	396,8			
572133-P14	25/04/2023	Voie 14 A l'air libre vers province	Revêtement de quai	358,0			
572133-P35	25/04/2023	Voie 14 Intersection Halle 3N et 2N	Revêtement de quai	2 672,0	573566-P1	16/05/2023	617,2

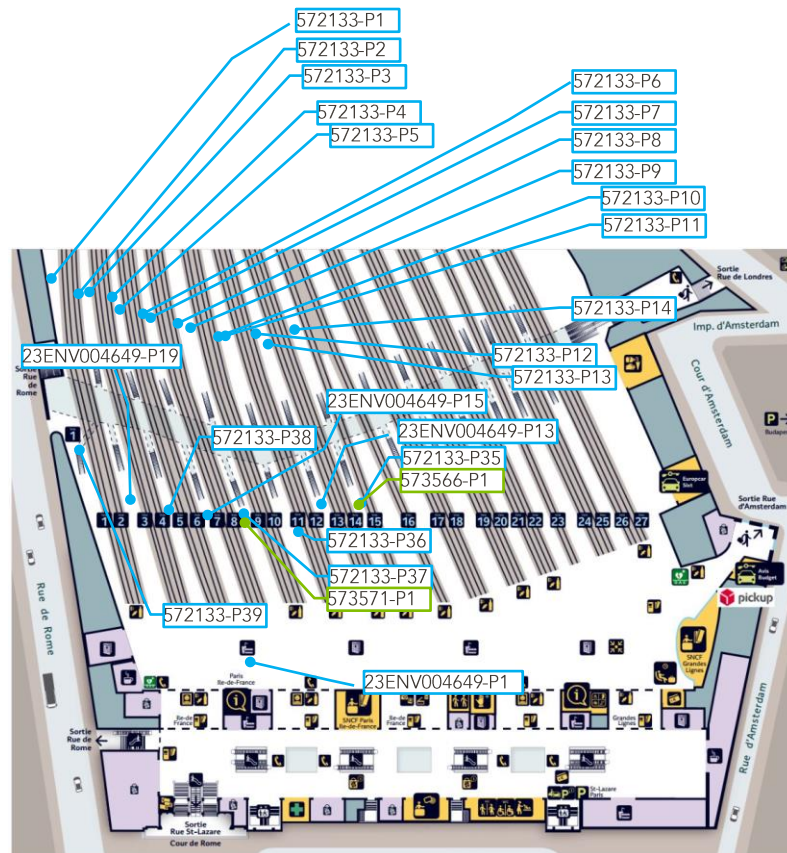


* Seuil du code de la santé publique applicable aux immeubles d'habitation fréquentés régulièrement par les mineurs ou les femmes enceintes

Voies 1 à 13

Equipement des quais

Mesures initiales

N° test	Date du prélèvement	Prélèvement	Support du prélèvement	Résultat lingette (en µg/m ²)
23ENV004649-P2	16/05/2023	Quai transversal Face voies 6-7 - Ecran info voyageurs	Poteau métal	<10,0
23ENV004649-P20	16/05/2023	Quai 1 Début de quai Voie 1 - Poubelle	Métal	43,6
23ENV004649-P18	16/05/2023	Quai 2 Début de quai Voies 2/3 - Poubelle	Métal	29,6
23ENV004649-P17	16/05/2023	Quai 3 Début de quai Voies 4/5 - Poubelle	Métal	<10,0
23ENV004649-P16	16/05/2023	Quai 3 Début de quai Voies 4/5 - Bouton de commande PTS	Métal	14,4
23ENV004649-P21	16/05/2023	Quai 4 Milieu de quai Voies 6/7 - Ecran info voyageurs	Tranche écran	265,2
573574-P2	17/05/2023	Quai 5 Milieu de quai Voies 8/9 - Poubelle	Surface opercule	23,8
573574-P1	17/05/2023	Quai 5 Voies 8/9 - Bouton de commande PTS	Métal	150
23EN-V004649-P14	16/05/2023	Quai 6 Voies 10/11 début de quai - Banc	Métal	53,2

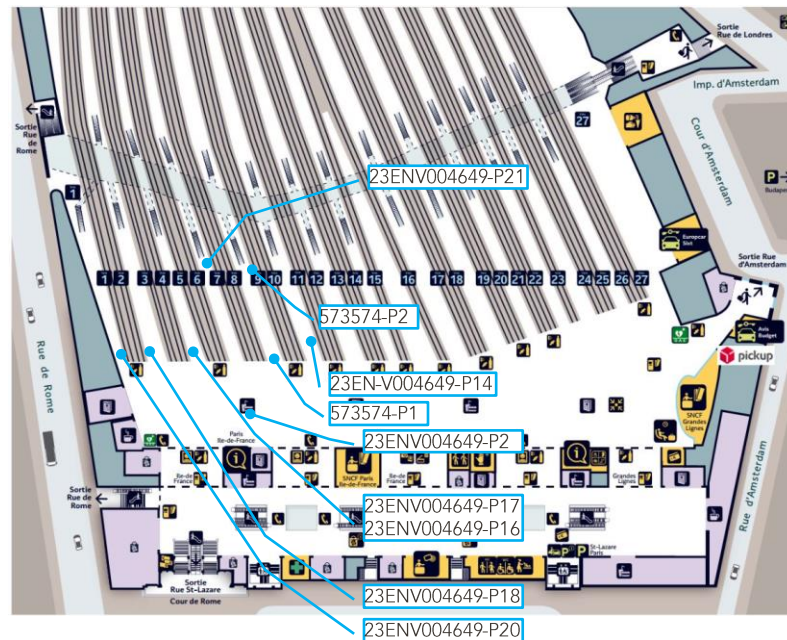


* Seuil du code de la santé publique applicable aux immeubles d'habitation fréquentés régulièrement par les mineurs ou les femmes enceintes

Voies 14 à 27

Equipement des quais

Mesures initiales

N° test	Date du prélèvement	Prélèvement	Support du prélèvement	Résultat lingette (en $\mu\text{g}/\text{m}^2$)
23ENV004649-P4	16/05/2023	Quai transversal Face voies 15-16 - Ecran info voyageurs	Poteau métal	<10,0
23ENV004649-P12	16/05/2023	Quai 8 Milieu de quai Voies 14/15 - Panneau publicitaire	Bas panneau et tranche	210,4
573569-P2	16/05/2023	Quai 8 1ère trémie d'escalier Voies 14/15 - Banc	Métal	720
573569-P1	16/05/2023	Quai 8 Voies 14/15 - Bouton de commande PTS	Métal	38,8
00573564-P1	12/05/2023	Quai 9 Voies 16/17 - Bouton de commande PTS	Métal	54,4
00573564-P2	12/05/2023	Quai 9 Voies 16/17 - Poubelle	Surface opercule	127,2
23ENV004649-P10	16/05/2023	Quai 10 Début de quai Voies 18/19 - Banc	Métal	74,4
23ENV004649-P9	16/05/2023	Quai 11 Début de quai Voies 20/21 - Bouton de commande PTS	Métal	10
23ENV004649-P22	16/05/2023	Quai 12 Milieu de quai Voie 22 - Horloge	Métal	912,8
23ENV004649-P7	16/05/2023	Quai 12 Milieu de quai Voie 22 - Poubelle	Surface opercule	51,2
23ENV004649-P6	16/05/2023	Quai 14 Voies 25/26 - Scan porte d'embarquement	Surface horizontale métal	13,2

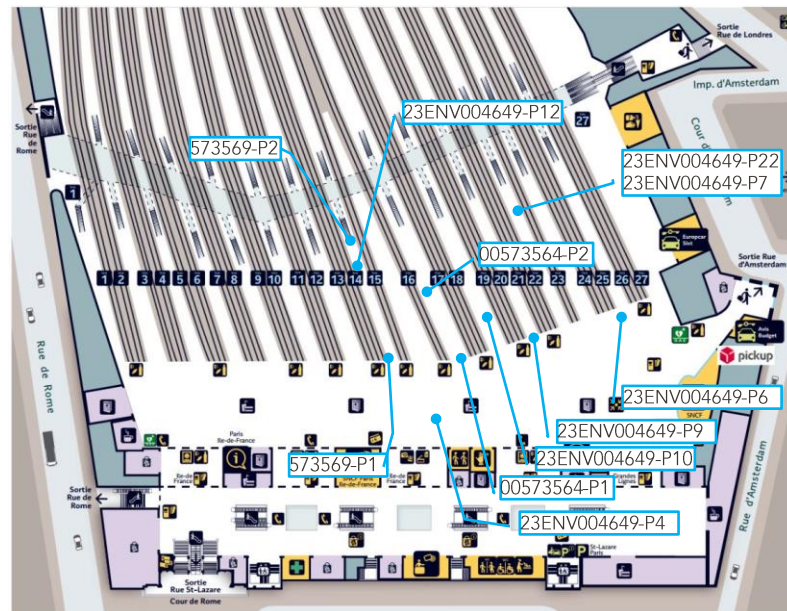

* Seuil du code de la santé publique applicable aux immeubles d'habitation fréquentés régulièrement par les mineurs ou les femmes enceintes
